



**LAPORAN IMPLEMENTASI  
DOKUMEN RENCANA AKSI PENGADAAN TANAH  
DAN PEMUKIMAN KEMBALI**

**HUNIAN TETAP SATELIT**

---

**LOLI TASIBURI**

---

**DESA LOLI TASIBURI  
KECAMATAN BANAWA  
KABUPATEN DONGGALA**

**PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**2022**

## BAB 1 IMPLEMENTASI PENGADAAN LAHAN

Pasca bencana gempa bumi, Tsunami dan likuifaksi, pemerintah kabupaten donggala dalam hal ini Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Donggala melakukan pembebasan lahan yang akan di peruntukan sebagai lahan relokasi bagi Warga terdampak bencana yang memenuhi kriteria keberhakan di kabupaten Donggala pada umumnya dan Khususnya Desa Loli Tasiburi dengan rincian sebagai berikut :

No.	Lokasi	Nama Pemilik Tanah	Luas Tanah (m <sup>2</sup> )	Bukti Kepemilikan Warga		Bukti Penyerahan ke Pemda		Status Saat ini
				No Surat	Akses Dokumen (Ctrl + Klik)	No Surat	Akses Dokumen Kiitansi dan Surat Penyerahan (Ctrl + Klik)	
1	Lahan Tasiburi 1	Djamin L. Lara	8.335	SKPT No. 590/001/VIII/2020	<a href="#">Link</a>	Penyerahan: Nomor; 592.2/89/BNW/X II/2020	<a href="#">Link</a>	Tanah Milik Pemda
2		Amrin Tandiwala	1.950	SHM. NO. 00132 NIB: 19.01.03.14.02036	<a href="#">Link</a>	Pelepasan Hak. Nomor; 108/72.03.AT.02.03/III/2021	<a href="#">Link</a>	Tanah Milik Pemda
3		Taja	665	SKPT No. 590/002/VIII/2020	<a href="#">Link</a>	Penyerahan : 592.2/89/BNW/X II/2020	<a href="#">Link</a>	Tanah Milik Pemda
4		Nenda	6.961	SKPT No. 590/151/VI/2020	<a href="#">Link</a>	Penyerahan. Nomor; 592.2/05/BNW/I/2021	<a href="#">Link</a>	Tanah Milik Pemda
5	Lahan Tasiburi 2	Camrin	1.181	SKPT No. 590/152/VI/2020	<a href="#">Link</a>	Surat Penyerahan. Nomor; 592.2/06/BNW/I/2021	<a href="#">Link</a>	Tanah Milik Pemda
<b>Total</b>			<b>19.092</b>					

Pemerintah Daerah melakukan pelepasan hak atas lahan huntap selanjutnya kepemilikan sertifikat lahan oleh warga dihapuskan subjeknya oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Donggala sehingga lahan tersebut statusnya berubah menjadi tanah negara bebas milik Pemerintah Kabupaten Donggala sesuai dengan :

1. Kepres No. 34 Tahun 2003 tentang kebijakan nasional bidang pertanahan
2. PP No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.
3. PP no 18 tahun 2021 tentang pnceolaan, HAT dan satuan rumah susun, dan pendaftaran tanah.

Kemudian lahan tersebut diajukan pembuatan sertifikat hak milik kepada ATR/BPN Kabupaten Donggala atas nama masing-masing warga terdampak bencana yang akan tinggal di hunian tetap Loli Taiburi 1 dan Loli Tasiburi 2 (lebih lanjut dijelaskan pada BAB 3).

## **BAB II**

### **IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN HUNTAP GANTI**

Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana menempatkan Desa Loli Tasiburi menjadi salah satu lokasi pembangunan Hunian Tetap satelit bagi warga terdampak bencana di Kecamatan Banawa. Pembangunan tersebut masuk dalam paket pembangunan 1b yang di laksanakan oleh pihak kontraktor yaitu PT Waskita Karya dan Konsultan pengawas PT Yodya Karya. Jumlah huntap yang di bangun oleh kontraktor di Huntap Loli Tasiburi 1 sebanyak 27 Unit dan di loli Tasiburi 2 sebanyak 32 unit dengan menggunakan konsep Rumah tahan gempa (RTG).

Pembangunan Huntap Loli Tasiburi 1 dan Loli Tasiburi 2 selesai pada bulan Maret 2022, pembangunan infrastruktur, fasilitas pendukung berupa fasilitas umum dan fasilitas sosial. Infrastruktur yang direncanakan yaitu Taman/Ruang Terbuka Hijau (RTH), drainase, sistem pengelolaan air minum (SPAM), Bak Sampah, jalan utama, dan jalan lingkungan, Proses pembangunan infrastruktur tersebut dapat di lihat pada tabel berikut ini:

**Progres Pembangunan Huntap Satelit Loli Tasiburi (Lahan 1)**

NO	ITEM PEKERJAAN	UNIT			JUMLAH UNIT	SISA UNIT
		1-10	11-20	21-27		
1	PONDASI	10	10	7	27	0
2	INSTALASI RIHSA	10	10	7	27	0
3	COR LANTAI	10	10	7	27	0
4	PASANG DINDING	10	10	7	27	0
5	RANGKA ATAP	10	10	7	27	0
6	LISPLANK	10	10	7	27	0
7	PEMASANGAN ATAP	10	10	7	27	0
8	WC	10	10	7	27	0

NO	ITEM PEKERJAAN	UNIT			JUMLAH UNIT	SISA UNIT
		1-10	11-20	21-27		
9	KUSEN	10	10	7	27	0
10	PLAFON	10	10	7	27	0
11	PENGE CETAN	10	10	7	27	0
12	INSTALASI LISTRIK	10	10	7	27	0
13	FINISHING	10	10	7	27	0

Progres Pembangunan Huntap Satelit Loli Tasiburi (Lahan 2)

NO	ITEM PEKERJAAN	UNIT			JUMLAH UNIT	SISA UNIT
		1-10	11-20	21-32		
1	PONDASI	10	10	12	32	0
2	INSTALASI RIHSA	10	10	12	32	0
3	COR LANTAI	10	10	12	32	0
4	PASANG DINDING	10	10	12	32	0
5	RANGKA ATAP	10	10	12	32	0
6	LISPLANK	10	10	12	32	0
7	PEMASANGAN ATAP	10	10	12	32	0
8	WC	10	10	12	32	0
9	KUSEN	10	10	12	32	0
10	PLAFON	10	10	12	32	0
11	PENGE CETAN	10	10	12	32	0

12	INSTALASI LISTRIK	10	10	12	32	0
13	FINISHING	10	10	12	32	0

**Progres Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dan Infrastruktur (Lahan 1)**

NO	ITEM PEKERJAAN	Volume	Satuan	Sumber Dana	Tahun Penyelesaian	Status Realisasi
<b>Infrastruktur</b>						
1	Jalan	325	Meter	NSUP CERC	2022	Selesai
2	Drainase	690	Meter	NSUP CERC	2022	Selesai
3	ME (Mechanical Electrical)	27	Unit	NSUP CERC	2022	Selesai
4	RTH (Ruang Terbuka Hijau)	3	titik	CSRRP	2022	Belum dibuat
5	PJU (Penerangan Jalan Umum)	8	Titik	NSUP CERC	2022	Selesai
<b>Persampahan</b>						
6	Infrastruktur Persampahan	27	Unit	NSUP CERC	2022	Selesai
<b>SPAM</b>						
7	Reservoir (Torent 2200 L)	2	Unit	NSUP CERC	2022	Selesai
8	Tandon Air	27	Unit	NSUP CERC	2022	Selesai
9	SR (Sambungan Rumah)	27	Unit	NSUP CERC	2022	Selesai
<b>SPAL</b>						
10	BioTank	27	Unit	NSUP CERC	2022	Selesai

**Progres Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dan Infrastruktur (Lahan 2)**

NO	ITEM PEKERJAAN	Volume	Satuan	Sumber Dana	Tahun Penyelesaian	Status Realisasi
<b>Infrastruktur</b>						
1	Jalan	250	Meter	NSUP CERC	2022	Selesai

2	Drainase	521	Meter	NSUP CERC	2022	Selesai
3	ME (Mechanical Electrical)	32	Unit	NSUP CERC	2022	Selesai
4	RTH (Ruang Terbuka Hijau)	3	titik	CSRRP	2022	Belum dibuat
5	PJU (Penerangan Jalan Umum)	8	Titik	NSUP CERC	2022	Selesai
<b>Persampahan</b>						
6	Infrastruktur Persampahan	32	Unit	NSUP CERC	2022	Selesai
<b>SPAM</b>						
7	Reservoir (Torent 2200 L)	2	Unit	NSUP CERC	2022	Selesai
8	Sumur Bor	1	Unit	NSUP CERC	2022	Selesai
9	Tandon Air	32	Unit	NSUP CERC	2022	Selesai
10	SR (Sambungan Rumah)	32	Unit	NSUP CERC	2022	Selesai
<b>SPAL</b>						
11	BioTank	32	Unit	NSUP CERC	2022	Selesai


Gambar 1 Akses Jalan Huntap Loli Tasiburi (Lahan 1)



Gambar 2 Akses Jalan Huntap Loli Tasiburi (Lahan 2)



## Pembangunan Infrastruktur Huntap Satelit Loli Tasiburi

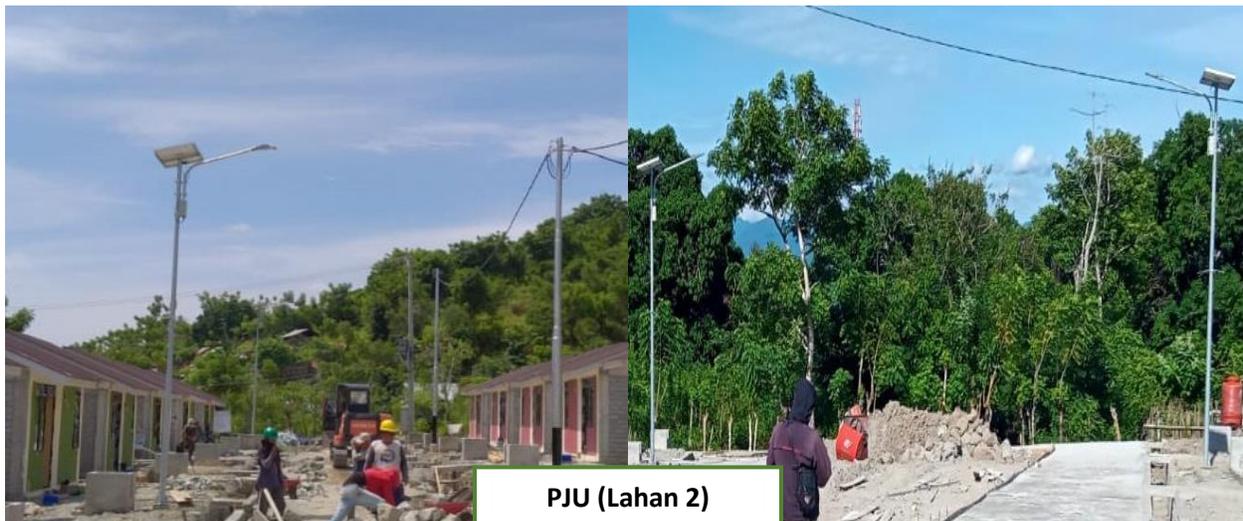



**Drainase (Lahan 1)**



**Drainase (Lahan 2)**



**Reservoir/Torent (Lahan 1)**



**Reservoir/Torent (Lahan 2)**



**Bak Sampah (Lahan 1)**



**Bak Sampah (Lahan 2)**





**Jalan Utama**



**Akses Jalan (Lahan 1)**



**Jalan Lingkungan**



**Jalan Utama**



**Akses Jalan (Lahan 2)**



**Jalan Lingkungan**

### BAB III

## IMPLEMENTASI PENGHUNIAN DAN PASCA PENGHUNIAN HUNTAP LOLI TASIBURI

Berdasarkan Dokumen RAP Huntap Loli Tasiburi telah di susun rencana aksi penghunian dan pasca penghunian yang akan menjadi dasar kegiatan di huntap, untuk itu pada uraian di bawah ini akan menjelaskan proses implementasi dari rencana aksi tersebut diantaranya:

#### Rencana Teknis Pemindahan

No	Kegiatan	Output	Waktu	Tempat	Kebutuhan	PIC	Status
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan kegiatan rebug persiapan penghunian Lahan 1 bersama WTB Loli Tasiburi.</li> <li>• Pelaksanaan kegiatan rebug persiapan penghunian Lahan 2 bersama WTB Loli Tasiburi dan Loli Pesua.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Semua WTB memahami dan menyepakati jadwal/rencana penghunian huntap.</li> <li>2. Hal-hal yang disampaikan antara lain:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketersediaan infrastruktur</li> <li>• Skema pemindahan dan serah terima kunci rumah</li> <li>• Rencana pengecekan unit partisipatif bersama</li> </ul> </li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 15 Maret 2022. Pukul 20.00 WITA-selesai.</li> <li>• 17 Maret 2022. Pukul 20.00 WITA-selesai.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kantor Desa Loli Tasiburi.</li> <li>• Kantor Desa Loli Tasiburi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berita acara kesepakatan &amp; daftar hadir</li> <li>• Data BNBA 59 WTB</li> <li>• Peta persil hunian tetap satelit Loli Tasiburi</li> <li>• Notulensi pertemuan</li> </ul>	OSP, Tim Korwil Region Donggala dan Fasilitator Huntap Loli Tasiburi.	Selesai

No	Kegiatan	Output	Waktu	Tempat	Kebutuhan	PIC	Status
2	Briefing Fasilitator Teknik untuk mendampingi WTB dalam kegiatan pengecekan partisipatif unit huntap.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fasilitator memahami mekanisme dan komponen unit huntap yang akan dicek.</li> <li>- Fasilitator memahami prosedur serah terima kunci dan cara pendokumentasian.</li> </ul>	18 Maret 2022.	Posko Fasilitator Loli Tasiburi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jadwal pengecekan unit rumah warga terdampak bencana berdasarkan kelompok masyarakat</li> <li>• Skema tahapan dan rencana pemindahan</li> </ul>	Tim Korwil dan Tim Fasilitator	Selesai
3	Pelaksanaan cek unit huntap secara partisipatif bersama WTB.Huntap Loli Tasiburi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fasilitator teknik mendampingi 59 WTB untuk mengecek kesiapan unit rumah</li> <li>- Lembar hasil pengecekan</li> </ul>	20 Maret 2022.	Lokasi Huntap Satelit Loli Tasiburi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jadwal pengecekan unit rumah warga terdampak bencana berdasarkan kelompok masyarakat</li> <li>• Lembar pengecekan</li> <li>• Daftar Hadir dan berita acara</li> </ul>	Tim Korwil dan Tim Fasilitator	Selesai
4	Dokumen SK Penghunian Huntap Loli Tasiburi.	- Daftar nama WTB beserta Blok unit Huntap Loli Tasiburi	21 Maret 2022	Kantor Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Donggala	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data kelengkapan WTB SK penghunian</li> <li>• Skema tahapan dan rencana pemindahan</li> <li>• Kesiapan Pemerintah Kabupaten Donggala</li> </ul>	Dinas PERKIMTAN Kabupaten Dongga	Selesai
5	Perbaikan fisik rumah	- Unit huntap dapat diperbaiki berdasarkan lembar ceklis hasil pengecekan unit.	21 – 28 Maret 2022.	Lokasi Huntap Satelit Loli Tasiburi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data hasil pengecekan unit</li> </ul>	PT. Waskita Karya	Perbaikan tetap dilakukan pasca

No	Kegiatan	Output	Waktu	Tempat	Kebutuhan	PIC	Status
							penghuniaan di masa pemeliharaan sampai maret 2023 ( 1 Tahun masa pemeliharaan)
6	Persiapan Akhir	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penggandaan berita acara serah terima unit rumah.</li> <li>- Persiapan perlengkapan</li> </ul>	26 Maret 2022.	Lokasi Huntap Satelit Loli Tasiburi.		Tim Korwil dan Tim Fasilitator	Selesai
7	Proses serah terima kunci, Penandatanganan surat perjanjian dan berita acara	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penandatanganan Berita acara serah terima kunci dan surat perjanjian.</li> <li>- WTB mendapatkan kebijakan dan informasi mengenai hal-hal terkait pasca penghunian</li> </ul>	27 Maret 2022.	Posko Informasi Fasilitator.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen Berita Acara Serah terima Kunci dan Surat Pernyataan</li> </ul>	Fasilitator Huntap Satker Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR	Selesai
8	Perpindahan barang dan aktivitas penghunian	<ul style="list-style-type: none"> <li>- WTB mulai melakukan aktivitas pembersihan dan penghunian huntap.</li> </ul>	Maret - April 2022	Lokasi Huntap Satelit Loli Tasiburi.	Penjadwalan Pемindahan	WTB Loli Tasiburi	Selesai

### Indikator Penghidupan

NO	KRITERIA	INDIKATOR PEMULIHAN PENGHIDUPAN	Status
1	Layanan Pendidikan dasar terjangkau bagi WTB	Tersedianya sekolah yang bisa menampung siswa dari warga terdampak bencana. Sekolah Menengah Atas ( SMA ) belum ada di Desa Tasiburi.	SMA terdekat berada di Desa Kabonga
2	Layanan Kegiatan Keagamaan	Tersedianya Mesjid/Musollah & Tempat Pengajian Al-Qur'an (TPA) yang dapat memfasilitasi WTB beserta anak-anaknya yang akan tinggal di lingkungan huntap Satelit Loli Tasiburi.	Tempat pengajian untuk warga huntap sudah terpenuhi dengan adanya Masjid terdekat yang berada di sekitar huntap
3	Layanan Kesehatan dasar	Adanya layanan kesehatan (Posyandu) dan penambahan tenaga kesehatan di puskesmas yang dapat dijangkau oleh WTB terutama kesehatan dasar, kelompok rentan antara lain ; lansia dan Balita serta Ibu hamil mendapatkan jangkauan layanan kesehatan.	Adanya Layanan Poskesdes yang dekat dan letaknya berada di sekitaran huntap Lili Tasiburi
4	Perpindahan Administras Kependudukan mudah	Pemerintah Desa membantu proses perpindahan administrasi kependudukan. Disdukcapil memberikan prioritas layanan bagi Warga Terdampak Bencana walaupun layanannya tidak berada di lokasi hunian tetap.	Akan di bicarakan lebih lanjut bersama dengan Camat Banawa
5	Ekonomi /Pendapatan	Membuka peluang dan akses secara terbuka bagi WTB untuk dapat mengakses modal, manajemen usaha, pemasaran dan akses terhadap peningkatan kemampuan dan kapasitas.	Belum

NO	KRITERIA	INDIKATOR PEMULIHAN PENGHIDUPAN	Status
6	Kesehatan Lingkungan	Terciptanya lingkungan yang asri, sehat dan tidak tercemar dengan menyediakan ruang terbuka hijau serta sistem pengelolaan sampah dan limbah yang baik.	Saat ini sudah terbentuk tim operasi dan Pemeliharaan sampai dengan pemberian bimbingan teknis untuk menjaga dan merawat infrastruktur yang telah terbangun

**Rencana Aksi Pemberian Hak Sertipikat Kepada Warga Terdampak Bencana Hunian Tetap Satelit Loli Tasiburi**

No	Kegiatan	Waktu	Pelaksana/ penanggungjawab	Sumber Dana	Status
1	Pertemuan dengan tim teknis pengadaan tanah membahas tahapan rencana pemberian hak atas tanah kepada warga terdampak bencana	Februari 2021	Sekda/Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	APBD	Selesai
2	Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan mengajukan surat ke instansi terkait dalam pembuatan sertipikat rumah lintas sektor	Juni 2022	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	APBD	Data WTB yang masuk dalam pembuatan Sertipikat lintas sector sudah di sampaikan kepada Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kab. Donggala serta diteruskan kepada OPD terkait

No	Kegiatan	Waktu	Pelaksana/ penanggungjawab	Sumber Dana	Status
3	Pemerintah Kabupaten Donggala mengajukan surat permohonan penerbitan sertipikat hak milik atas nama warga terdampak bencana dengan melampirkan siteplan & SK Penghunian warga terdampak bencana penerima hunian tetap satelit yang diterbitkan oleh Bupati Kabupaten Donggala	November 2022	Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan	APBD	Belum
4	Pihak Kantor Pertanahan Kab. Donggala memproses dokumen yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Donggala	Desember 2022	Kantor Pertanahan Kab. Donggala	APBD	Belum
5	Pihak Kantor Pertanahan Kab. Donggala menugaskan timnya untuk melakukan pengukuran bidang tanah dan memproses penerbitan sertipikat untuk warga terdampak bencana	Desember 2022	Kantor Pertanahan Kab. Donggala dan Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan	APBD	Belum
6	Penerbitan SK pemberian hak oleh Kantor Pertanahan Kab. Donggala	Tahun 2023	Kantor Pertanahan Kab. Donggala	APBD	Belum
7	Penerbitan sertipikat untuk setiap Warga Terdampak Bencana	Tahun 2023	Kantor Pertanahan Kab. Donggala	APBD	Belum
8	Pemberian Hak Atas Tanah (HAT) kepada warga terdampak bencana	Tahun 2023	Pemerintah Kabupaten Donggala dan Kementerian PUPR	APBD	Belum

**Rencana Aksi Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)**

No	Kegiatan	PIC	Target Pelaksanaan	
1	Permohonan Keterangan Rencana Kota (KRK)	Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Donggala	Tahun 2023	Belum
2	SK Pembebasan Biaya PBG dan BPHTB	Dinas PU dan Tata Ruang Kabupaten Donggala	Tahun 2023	Belum
3	Pengisian Formulir PBG dan SLF dgn melampirkan: a. Fotocopy Surat Tanah b. Siteplan dan DED yang disahkan Dinas Perkim c. Dokumen Lingkungan	Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Donggala	Tahun 2023	Belum
4	Pengisian data melalui SIMBG	Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Donggala	Tahun 2023	Belum
5	Verifikasi Tim Teknis ke Lapangan	Dinas PU dan Tata Ruang Kabupaten Donggala	Tahun 2023	Belum
6	Proses Penerbitan PBG dan SLF	Dinas PU dan Tata Ruang Kabupaten Donggala	Tahun 2023	Belum

### Rencana Aksi dan Skema Pemulihan

No	Skema Pemulihan Penghidupan	PIC	Target Waktu	Indikator	Sumber Pendanaan	Tahun Anggaran	Status
1	Pemindahan calon penghuni ke huntap Loli Tasiburi Tahap 1	Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan	Maret 2022 – Juni 2022	WTB Huntap Loli Tasiburi yang tercantum dalam SK melakukan serah terima Kunci dan menghuni 59 unit huntap	Swadaya Masyarakat	-	Selesai
2	Pelatihan operasionalisasi dan Maintenance Hunian tetap, kelisitrikan, IPAL, drainase dll	OSP dan Pemerintah Kabupaten Donggala	Mei 2022 – Juni 2022	WTB mengetahui bagaimana operasionalisasi dan perawatan dari investasi yang diberikan dari pemerintah	APBN	2022	Selesai
3	Pembahasan rencana penataan permukiman Huntap Loli Tasiburi serta aturan bersama	Kepala Desa Loli Tasiburi, Camat Banawa dan Fasilitator Huntap	Mulai Juni 2022	Huntap Loli Tasiburi memiliki rencana pengembangan permukiman yang lebih tertata dan bertahap. Menghindari kekumuhan.	APBN	2022	Selesai
4	Pembahasan rencana pengelolaan aset bersama dan rencana pembiayaan untuk PSU dan Infrastruktur	Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Donggala	Juli 2022	Mekanisme pengelolaan aset PSU dan Infrastruktur dan tata kelola untuk menunjang sustainability.	APBD	2022	Belum
5	Pembahasan rencana pemulihan ekonomi warga Huntap Loli Tasiburi	Pemerintah Kabupaten Donggala	September 2022	Skema pemulihan ekonomi warga Huntap Loli Tasiburi, dukungan program dan pembiayaan, dukungan dinas dan lembaga non pemerintah.	APBN	2022	Belum
6	Pembahasan rencana pemulihan untuk kaum perempuan, anak, rentan, difabel dan lansia	Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Donggala	September 2022	Skema Pendampingan dan pemulihankondisi sosial di lokasi Huntap Loli Tasiburi	APBD	2022	Belum

No	Skema Pemulihan Penghidupan	PIC	Target Waktu	Indikator	Sumber Pendanaan	Tahun Anggaran	Status
7	Pembahasan Rencana pelatihan tanggap bencana (gempa, kebakaran, banjir, longsor dll)	BPBD Kabupaten Donggala	Oktober 2022	Warga terdampak bencana memahami potensi bencana yang akan dihadapi dan upaya penanggulangannya	APBD	2022	Belum
8	Rencana Serah terima Aset dari Kementerian PUPR ke Pemerintah Kabupaten Donggala	Kementerian PUPR	November 2022	Aset bersama dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Donggala	APBD	2022	Belum

## RENCANA TEKNIS PEMINDAHAN 59 WTB HUNTAPE SATELIT TASIBURI

1. Pertemuan dengan ketua kelompok masyarakat dan warga hunian tetap satelit Ganti melakukan sosialisasi dan rembuk rencana pemindahan sesuai hasil rapat persiapan hunian



2. Briefing fasilitator Teknik untuk mendampingi wtb dalam kegiatan pengecekan partisipatif.



3. Pengecekan unit hunian tetap bersama kelompok masyarakat dan WTB.



4. Proses pendatanganan dan serah terima kunci.



5. Perpindahan barang dan aktifitas penghunian.



## DOKUMENTASI RENCANA AKSI PEMULIHAN HUNTAH LOLI TASIBURI

### 1. Dokumentasi kegiatan pembentukan O&P di Huntap Loli Tasiburi.



### 2. Dokumentasi bimtek O&P PSU.



### 3. Dokumentasi bimtek O&P Biotank dan limbah.



4. Dokumentasi bimtek O&P persampahan.



5. Dokumentasi bimtek tukang Huntap Loli Tasiburi.

